


Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																												
					2020			2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>PROIECT DE ADMINISTRARE LOCALA - CORBEANCA</b>					18-																												
<b>ADMINISTRATIE LOCALA</b>					29-Jul-22, ADMINISTRATIE LOCALA																												
A1000	Validarea alegerilor locale si desemnarea Primarului	0	01-Dec-20*		◆ Validarea alegerilor locale si desemnarea Primarului, 01-Dec-20*																												
A1010	Preluarea primariei de catre noul primar	5	01-Dec-20	07-Dec-20	01-Dec-20, Preluarea primariei de catre noul primar																												
A1110	Securizarea registraturii	1	08-Dec-20	08-Dec-20	08-Dec-20, Securizarea registraturii																												
A1020	Analiza situatiei existente in primarie (contracte, buget, etc)	60	09-Dec-20	11-Mar-21	■ 09-Dec-20, Analiza situatiei existente in primarie (contracte, buget, etc)																												
A1030	Cerere catre Curtea de Conturi pentru efectuarea unui Audit	0	12-Mar-21		◆ Cerere catre Curtea de Conturi pentru efectuarea unui Audit, 12-Mar-21																												
A1040	Receptia si confirmarea auditului de catre Curtea de Conturi	10	12-Mar-21	25-Mar-21	■ 12-Mar-21, Receptia si confirmarea auditului de catre Curtea de Conturi																												
A1050	Inceperea auditului de catre Curtea de Conturi	0	26-Mar-21		◆ Inceperea auditului de catre Curtea de Conturi, 26-Mar-21																												
A1100	Inventarierea averii primariei (terenuri, cladiri, masini, etc)	45	12-Mar-21	13-May-21	■ 12-Mar-21, Inventarierea averii primariei (terenuri, cladiri, masini, etc)																												
A9100	Audit extern al aparatului administrativ si a functiei de manag	70	14-May-21	19-Aug-21	■ 14-May-21, Audit extern al aparatului administrativ si a functiei de management																												
A1060	Activitati de audit de catre Curtea de Conturi	120	26-Mar-21	09-Sep-21	■ 26-Mar-21, Activitati de audit de catre Curtea de Conturi																												
A1070	Receptia datelor in urma efectuarii auditului	0		09-Sep-21	◆ Receptia datelor in urma efectuarii auditului,																												
A1080	Analiza interna a primarului si a echipei pe baza datelor primi	20	10-Sep-21	07-Oct-21	■ 10-Sep-21, Analiza interna a primarului si a echipei pe baza datelor primite de la Curtea de Conturi																												
A1090	Stabilirea masurilor de luat in urma auditului si desemnarea e	0		07-Oct-21	◆ Stabilirea masurilor de luat in urma auditului si desemnarea echipei de atac,																												
<b>ACTUALIZARE PUG</b>					21-Apr-22, ACTUALIZARE PUG																												
A11030	Pregatirea documentatiei de atribuire	30	15-Jan-21	25-Feb-21	■ 15-Jan-21, Pregatirea documentatiei de atribuire																												
A11040	Lansarea licitatiei	1	26-Feb-21	26-Feb-21	26-Feb-21, Lansarea licitatiei																												
A11050	Inscrierea firmelor	20	01-Mar-21	26-Mar-21	■ 01-Mar-21, Inscrierea firmelor																												
A11060	Analiza ofertelor	20	29-Mar-21	23-Apr-21	■ 29-Mar-21, Analiza ofertelor																												
A11070	Desemnarea castigatorului licitatiei	1	26-Apr-21	26-Apr-21	26-Apr-21, Desemnarea castigatorului licitatiei																												
A11090	Consultare publica conform legilor in vigoare	60	27-Apr-21	19-Jul-21	■ 27-Apr-21, Consultare publica conform legilor in vigoare																												
A11080	Implementarea proiectului	252	27-Apr-21	21-Apr-22	■ 27-Apr-21, Implementarea proiectului																												
A11160	PROIECT ACTUALIZARE PUG	324	15-Jan-21	21-Apr-22																													
<b>DIGITALIZAREA ADMINISTRATIEI LOCALE IN RELATIA CU CETATEANUL</b>					29-Jul-22, DIGITALIZAREA ADMINISTRATIEI LOCALE IN RELATIA CU CETATEANUL																												
A11020	PROIECT "DIGITALIZARE"	384	01-Feb-21	29-Jul-22																													
<b>PORTAL SERVICII, PLATFORMA DE CONSULTARE ACETATENILOR, COMUNICARE INTE</b>					29-Jul-22, PORTAL SERVICII, PLATFORMA DE CONSULTARE ACETATENILOR, COMUNICARE																												
A10740	Pregatirea documentatiei de atribuire	45	01-Feb-21	02-Apr-21	■ 01-Feb-21, Pregatirea documentatiei de atribuire																												
A10750	Lansarea licitatiei	0	05-Apr-21		◆ Lansarea licitatiei, 05-Apr-21																												
A10760	Inscrierea firmelor	15	05-Apr-21	23-Apr-21	■ 05-Apr-21, Inscrierea firmelor																												
A10770	Analiza ofertelor	30	26-Apr-21	04-Jun-21	■ 26-Apr-21, Analiza ofertelor																												
A10780	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	07-Jun-21		◆ Desemnarea castigatorului licitatiei, 07-Jun-21																												
A10790	Implementarea proiectului	294	07-Jun-21	29-Jul-22	■ 07-Jun-21, Implementarea proiectului																												
<b>SISTEM DE MANAGEMENT DIGITAL AL DOCUMENTELOR INTERNE ALE PRIMARIEI SIA</b>					29-Jul-22, SISTEM DE MANAGEMENT DIGITAL AL DOCUMENTELOR INTERNE ALE PRIMARIEI SIA																												
A11100	Pregatirea documentatiei de atribuire	45	01-Feb-21	02-Apr-21	■ 01-Feb-21, Pregatirea documentatiei de atribuire																												
A11110	Lansarea licitatiei	0	05-Apr-21		◆ Lansarea licitatiei, 05-Apr-21																												
A11120	Inscrierea firmelor	15	05-Apr-21	23-Apr-21	■ 05-Apr-21, Inscrierea firmelor																												
A11130	Analiza ofertelor	30	26-Apr-21	04-Jun-21	■ 26-Apr-21, Analiza ofertelor																												
A11140	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	07-Jun-21		◆ Desemnarea castigatorului licitatiei, 07-Jun-21																												
A11150	Implementarea proiectului	294	07-Jun-21	29-Jul-22	■ 07-Jun-21, Implementarea proiectului																												
<b>PIATA AGROALIMENTARA A PRODUCATORILOR LOCALI</b>					01-Sep-22, PIATA AGROALIMENTARA A PRODUCATORILOR LOCALI																												
A11480	Identificarea unei locatii	20	01-Mar-22*	28-Mar-22	■ 01-Mar-22*, Identificarea unei locatii																												
A11490	Amenajare spatiu si utilitati	113	29-Mar-22	01-Sep-22	■ 29-Mar-22, Amenajare spatiu si utilitati																												
A11500	Proiect "Piata Agroalimentara"	133	01-Mar-22	01-Sep-22																													
<b>MEDIU</b>					01-Oct-24, MEDIU																												
<b>Ecologizare</b>					25-Aug-21, Ecologizare																												
A9670	Analiza la nivelul primariei privind zonele vulnerabile	20	08-Dec-20	13-Jan-21	■ 08-Dec-20, Analiza la nivelul primariei privind zonele vulnerabile																												
A9680	Identificare oamenilor care pot participa la ecologizare	35	14-Jan-21	03-Mar-21	■ 14-Jan-21, Identificare oamenilor care pot participa la ecologizare																												
A9690	Formarea echipelor	5	04-Mar-21	10-Mar-21	04-Mar-21, Formarea echipelor																												


■ Actual Level of Effort   
 ■ Remaining Work   
 ■ Actual Work   
 ■ Critical Remaining Work   
 ◆ Milestone   
 ▼ Summary

Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																												
					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A9700	Achizitia minimului necesar in vederea ecologizarii	5	04-Mar-21	10-Mar-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 04-Mar-21, Achizitia minimului necesar in vederea ecologizarii</li> </ul>																												
A9710	Activitati de ecologizare pe domeniul public	120	11-Mar-21	25-Aug-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 11-Mar-21, Activitati de ecologizare pe domeniul public</li> </ul>																												
<b>PERDELE FORESTIERE PE DOMENIUL PUBLIC</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Oct-24, PERDELE FORESTIERE PE DOMENIU</li> </ul>																												
A11390	Identificare zone	190	08-Jan-21	30-Sep-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 08-Jan-21, Identificare zone</li> </ul>																												
A11400	Achizitionare puieti	719	01-Oct-21	01-Aug-24	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Oct-21, Achizitionare puieti</li> </ul>																												
A11410	Plantare	741	01-Nov-21	01-Oct-24	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Nov-21, Plantare</li> </ul>																												
A11510	Proiect "Perdele Forestiere"	952	08-Jan-21	01-Oct-24																													
<b>Colectare selectiva</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 20-Nov-23, Colectare selectiva</li> </ul>																												
<b>DOTARE CU PUBELE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 17-Sep-21, DOTARE CU PUBELE</li> </ul>																												
A10960	PROIECT "DOTAREA CU PUBELE"	136	12-Mar-21	17-Sep-21																													
<b>ACHIZITIE / LICITATIE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 07-Jun-21, ACHIZITIE / LICITATIE</li> </ul>																												
A9240	Pregatirea caietului de sarcini pentru achizitii pubele	20	12-Mar-21	08-Apr-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 12-Mar-21, Pregatirea caietului de sarcini pentru achizitii pubele</li> </ul>																												
A9250	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	09-Apr-21		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP, 09-Apr-21</li> </ul>																												
A9260	Inscrierea firmelor	21	09-Apr-21	07-May-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 09-Apr-21, Inscrierea firmelor</li> </ul>																												
A9270	Analiza ofertelor	20	10-May-21	04-Jun-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 10-May-21, Analiza ofertelor</li> </ul>																												
A9280	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	07-Jun-21		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Desemnarea castigatorului licitatiei, 07-Jun-21</li> </ul>																												
<b>LIVRARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 27-Aug-21, LIVRARE</li> </ul>																												
A9300	Livrarea categoriilor de pubele conform caietului de sarcini	60	07-Jun-21	27-Aug-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 07-Jun-21, Livrarea categoriilor de pubele conform caietului de sarcini</li> </ul>																												
<b>EXECUTIE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 17-Sep-21, EXECUTIE</li> </ul>																												
A9720	Alinierea strategiei de colectare cu firma de salubritate	15	30-Aug-21	17-Sep-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 30-Aug-21, Alinierea strategiei de colectare cu firma de salubritate</li> </ul>																												
<b>INFINTARE STATIE DE COLECTARE CENTRALIZATA</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 20-Nov-23, INFINTARE STATIE DE COLECTARE CENTRALIZATA</li> </ul>																												
A10970	PROIECT "STATIE DE COLECTARE CENTRALIZATA"	576	20-Aug-21	20-Nov-23																													
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 23-Jan-23, PROIECTARE SI AUTORIZARE</li> </ul>																												
<b>AUTORIZARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 23-Jan-23, AUTORIZARE</li> </ul>																												
A9390	Depunere documentatie pentru obtinerea CU	0	01-Mar-22		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Depunere documentatie pentru obtinerea CU, 01-Mar-22</li> </ul>																												
A9400	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	30	01-Mar-22	11-Apr-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Mar-22, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea CU</li> </ul>																												
A9410	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU	150	12-Apr-22	07-Nov-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 12-Apr-22, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU</li> </ul>																												
A9420	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC)	50	08-Nov-22	23-Jan-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 08-Nov-22, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC)</li> </ul>																												
<b>PROIECTARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 25-Apr-22, PROIECTARE</li> </ul>																												
A9430	Studiu de pre-fezabilitate	20	20-Aug-21	16-Sep-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 20-Aug-21, Studiu de pre-fezabilitate</li> </ul>																												
A9450	Studiu de fezabilitate	30	13-Dec-21	31-Jan-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 13-Dec-21, Studiu de fezabilitate</li> </ul>																												
A9440	Realizarea DTAC	20	01-Feb-22	28-Feb-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Feb-22, Realizarea DTAC</li> </ul>																												
A9460	Activitati de proiectare	60	01-Feb-22	25-Apr-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 01-Feb-22, Activitati de proiectare</li> </ul>																												
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 22-Nov-22, PROCURARE / ACHIZITII</li> </ul>																												
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 13-Dec-21, SERVICII DE PROIECTARE</li> </ul>																												
A9470	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	20	17-Sep-21	14-Oct-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 17-Sep-21, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare</li> </ul>																												
A9480	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	15-Oct-21		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP, 15-Oct-21</li> </ul>																												
A9490	Inscrierea firmelor	21	15-Oct-21	12-Nov-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 15-Oct-21, Inscrierea firmelor</li> </ul>																												
A9500	Analiza ofertelor	20	15-Nov-21	10-Dec-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 15-Nov-21, Analiza ofertelor</li> </ul>																												
A9510	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	13-Dec-21		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Desemnarea castigatorului licitatiei, 13-Dec-21</li> </ul>																												
<b>SERVICII DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 22-Nov-22, SERVICII DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE</li> </ul>																												
A9730	Pregatirea caietului de sarcini pentru echipamente	20	15-Mar-22	11-Apr-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 15-Mar-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru echipamente</li> </ul>																												
A9740	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	12-Apr-22		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP, 12-Apr-22</li> </ul>																												
A9750	Inscrierea firmelor	21	12-Apr-22	10-May-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 12-Apr-22, Inscrierea firmelor</li> </ul>																												
A9760	Analiza ofertelor	20	11-May-22	07-Jun-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 11-May-22, Analiza ofertelor</li> </ul>																												
A9770	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	08-Jun-22		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Desemnarea castigatorului licitatiei, 08-Jun-22</li> </ul>																												
A9780	Livrarea echipamentelor (DDP - Incoterms)	120	08-Jun-22	22-Nov-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 08-Jun-22, Livrarea echipamentelor (DDP - Incoterms)</li> </ul>																												
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 06-Jul-22, SERVICII DE EXECUTIE</li> </ul>																												
A9520	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	20	12-Apr-22	09-May-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 12-Apr-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare</li> </ul>																												
A9530	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	10-May-22		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP, 10-May-22</li> </ul>																												
A9540	Inscrierea firmelor	21	10-May-22	07-Jun-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 10-May-22, Inscrierea firmelor</li> </ul>																												
A9550	Analiza ofertelor	20	08-Jun-22	05-Jul-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▮ 08-Jun-22, Analiza ofertelor</li> </ul>																												

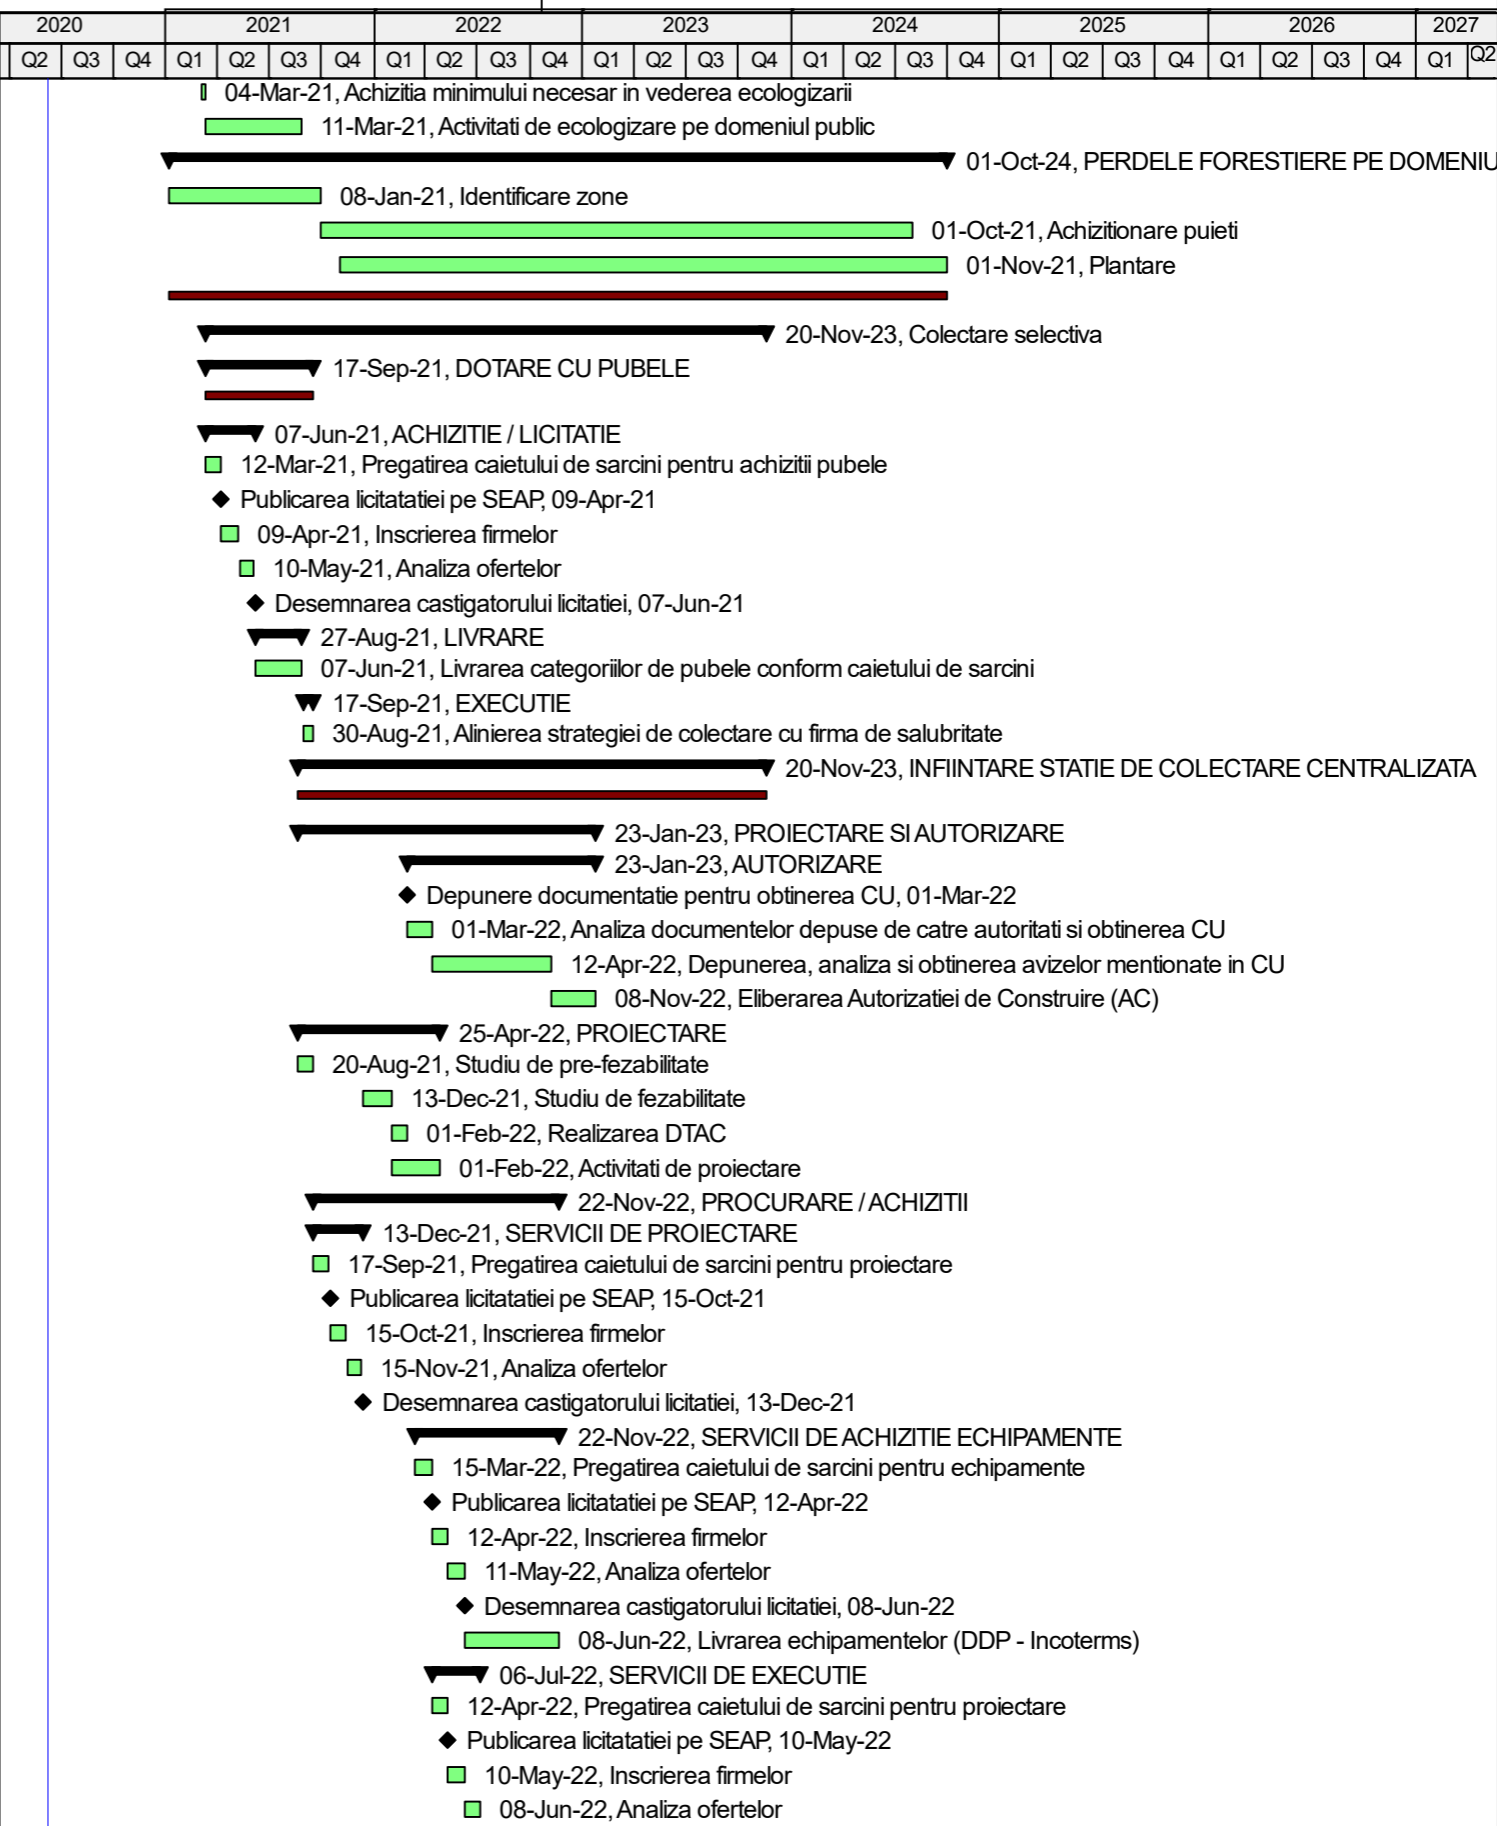

▬ Actual Work    
 ▬ Remaining Work    
 ◆ Milestone  
▬ Critical Remaining Work    
 ▬ Summary  
▬ Actual Level of Effort

Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027											
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2											
A9560	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	06-Jul-22																																									
<b>EXECUTIE</b>					205	24-Jan-23	06-Nov-23																																					
<b>CONSTRUCTIA FUNDATIEI / CLADIRILOR SI A PLATFORMEI STATIEI</b>					160	24-Jan-23	04-Sep-23																																					
A9580	Predarea amplasamentului de catre Primarie	0	24-Jan-23																																									
A9590	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor	0	25-Jan-23																																									
A9570	Stabilirea Organizarii de santier	10	24-Jan-23	06-Feb-23																																								
A9610	Constructia fundatiei / cladirilor si a platformei	150	07-Feb-23	04-Sep-23																																								
<b>MONTAREA ECHIPAMENTELOR</b>					45	05-Sep-23	06-Nov-23																																					
A9790	Montarea echipamentelor	45	05-Sep-23	06-Nov-23																																								
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>					10	07-Nov-23	20-Nov-23																																					
A9800	Efecturarea testelor si a PIF	10	07-Nov-23	20-Nov-23																																								
<b>EDUCATIE</b>					846	20-Aug-21	16-Dec-24																																					
<b>Extindere Program Before &amp; After School</b>					585	20-Aug-21	01-Dec-23																																					
A10980	PROIECT "AFTER SCHOOL"	585	20-Aug-21	01-Dec-23																																								
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					290	20-Aug-21	07-Oct-22																																					
<b>AUTORIZARE</b>					145	21-Mar-22	07-Oct-22																																					
A540	Depunere documentatie pentru obtinerea CU	0	21-Mar-22																																									
A550	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	40	21-Mar-22	13-May-22																																								
A560	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU	70	16-May-22	19-Aug-22																																								
A570	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC)	35	22-Aug-22	07-Oct-22																																								
<b>PROIECTARE</b>					185	20-Aug-21	13-May-22																																					
A580	Studiu de pre-fezabilitate	10	20-Aug-21	02-Sep-21																																								
A590	Studiu de fezabilitate	25	17-Jan-22	18-Feb-22																																								
A600	Realizarea DTAC	20	21-Feb-22	18-Mar-22																																								
A620	Activitati de proiectare	60	21-Feb-22	13-May-22																																								
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					370	03-Sep-21	20-Feb-23																																					
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					90	03-Sep-21	17-Jan-22																																					
A630	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	45	03-Sep-21	04-Nov-21																																								
A640	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	05-Nov-21																																									
A650	Inscrierea firmelor	15	05-Nov-21	25-Nov-21																																								
A660	Analiza ofertelor	30	26-Nov-21	14-Jan-22																																								
A670	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	17-Jan-22																																									
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					90	14-Mar-22	18-Jul-22																																					
A680	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	45	14-Mar-22	13-May-22																																								
A690	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	16-May-22																																									
A700	Inscrierea firmelor	15	16-May-22	03-Jun-22																																								
A710	Analiza ofertelor	30	06-Jun-22	15-Jul-22																																								
A720	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	18-Jul-22																																									
<b>ACHIZITII DE APARATURA SI MOBILIER SPECIFIC</b>					90	10-Oct-22	20-Feb-23																																					
A730	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	45	10-Oct-22	09-Dec-22																																								
A740	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	12-Dec-22																																									
A750	Inscrierea firmelor	15	12-Dec-22	06-Jan-23																																								
A760	Analiza ofertelor	30	09-Jan-23	17-Feb-23																																								
A770	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	20-Feb-23																																									
<b>EXECUTIE</b>					293	10-Oct-22	29-Nov-23																																					
<b>INFRASTRUCTURA &amp; SUPRASTRUCTURA</b>					290	10-Oct-22	24-Nov-23																																					
<b>PARTER</b>					173	10-Oct-22	14-Jun-23																																					
A5250	Predarea amplasamentului de catre Primarie	0	10-Oct-22																																									
A5260	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor	0	10-Oct-22																																									
A5270	Stabilirea Organizarii de santier	15	10-Oct-22	28-Oct-22																																								
A4700	Activitati de defrisare, pregatire a terenului	10	31-Oct-22	11-Nov-22																																								
A4710	Trasare si pichetarea terenului	1	14-Nov-22	14-Nov-22																																								

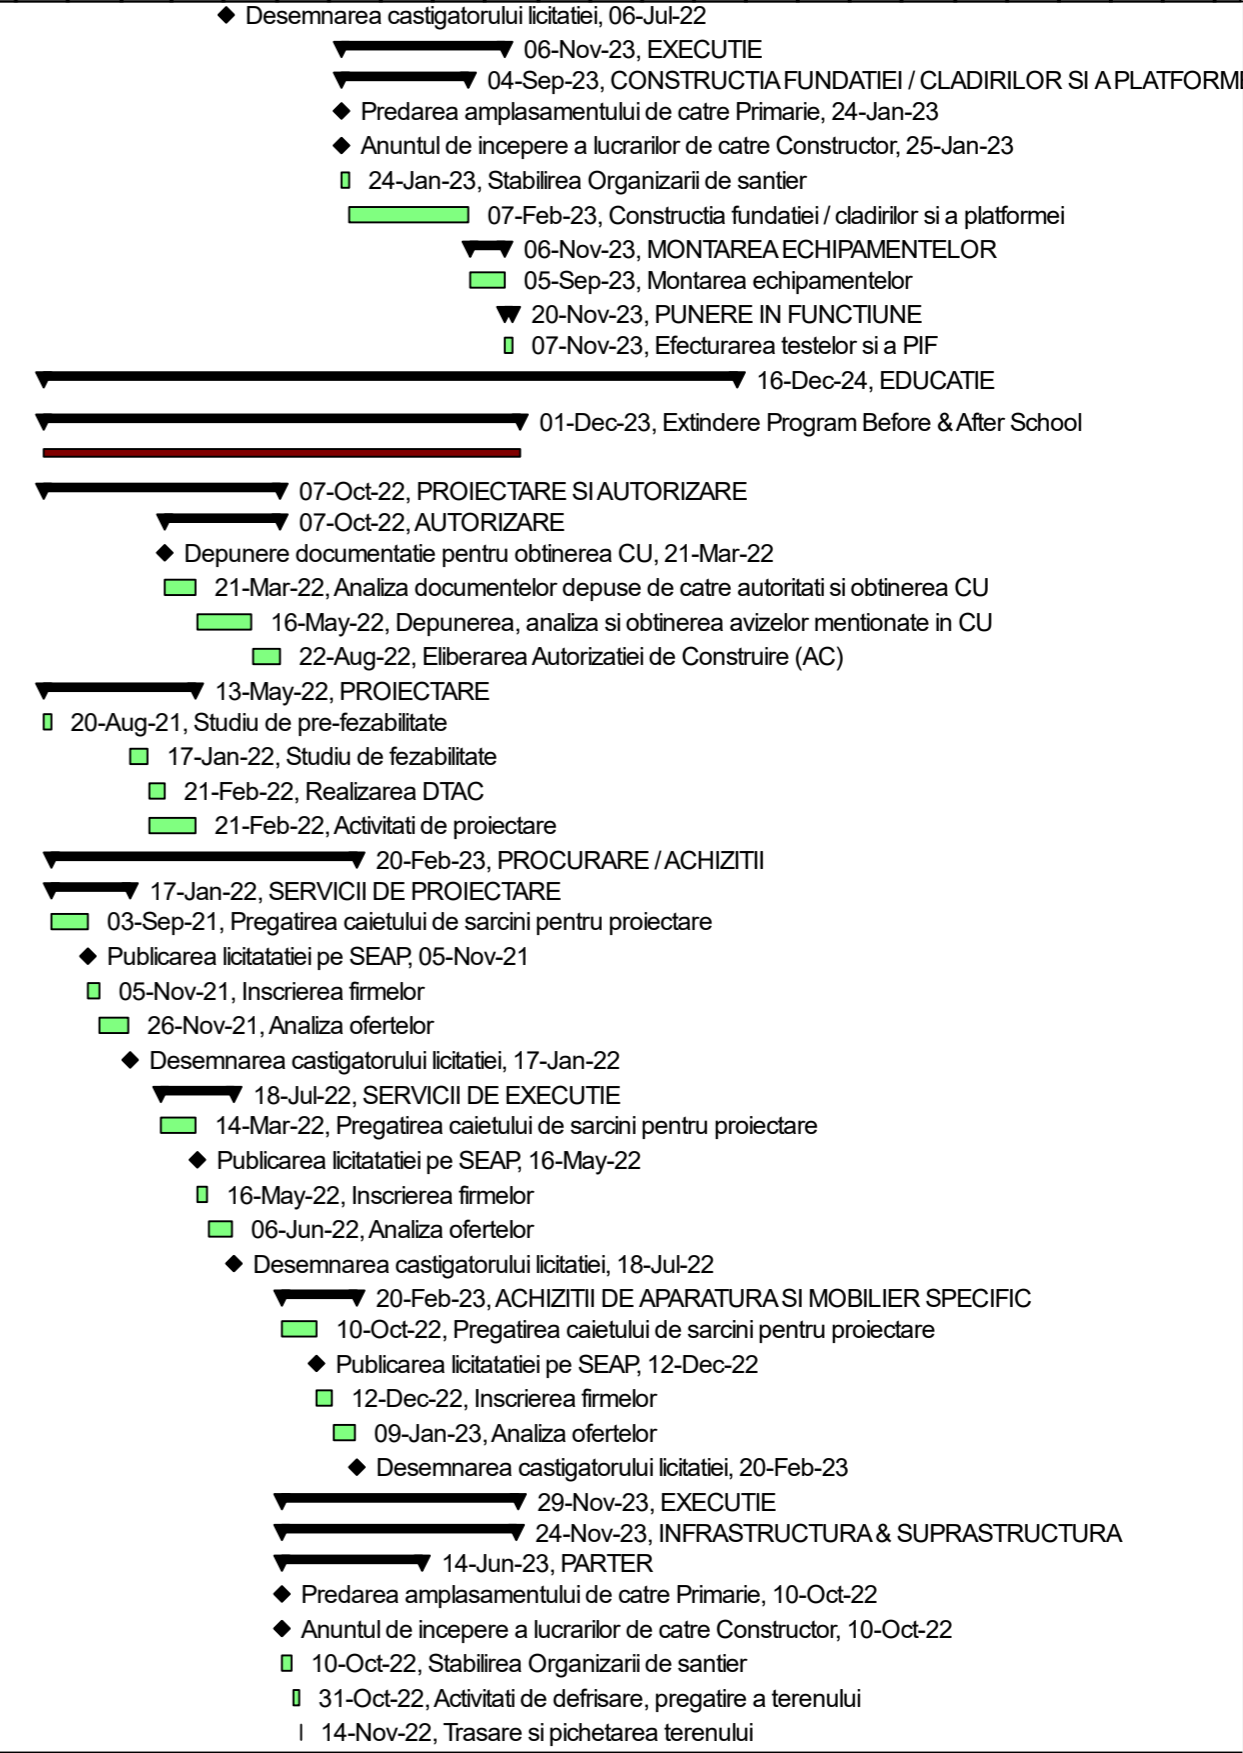


	Actual Level of Effort		Remaining Work		Milestone
	Actual Work		Critical Remaining Work		Summary



Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																													
					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
<b>RENOVARE</b>					06-Jan-23, RENOVARE																													
A6500	Recompartimentari si renovari	100	15-Aug-22	06-Jan-23	15-Aug-22, Recompartimentari si renovari																													
<b>UTILARE CU MOBILIER SPECIFIC</b>					12-May-23, UTILARE CU MOBILIER SPECIFIC																													
A6510	Fabricarea / procurarea mobilierului scolar de catre firma cas	70	09-Jan-23	14-Apr-23	09-Jan-23, Fabricarea / procurarea mobilierului scolar de catre firma castigatoare																													
A6530	Instalarea mobilierului specific in salile de curs	20	17-Apr-23	12-May-23	17-Apr-23, Instalarea mobilierului specific in salile de curs																													
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>					12-May-23, PUNERE IN FUNCTIUNE																													
A6520	Inaugurarea proiectului "Dotarea si Imbunatatirea Facilitatilor	0	12-May-23	12-May-23	12-May-23, Inaugurarea proiectului "Dotarea si Imbunatatirea Facilitatilor Scolare",																													
<b>Terenuri de sport</b>					16-Dec-24, Terenuri de sport																													
A11000	PROIECT "TERENURI DE SPORT"	496	09-Jan-23	16-Dec-24	16-Dec-24, Terenuri de sport																													
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					01-Mar-24, PROIECTARE SI AUTORIZARE																													
<b>AUTORIZARE</b>					01-Mar-24, AUTORIZARE																													
A9820	Depunere documentatie pentru obtinerea CU	0	31-Jul-23		31-Jul-23, Depunere documentatie pentru obtinerea CU, 31-Jul-23																													
A9830	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	40	31-Jul-23	22-Sep-23	31-Jul-23, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea C																													
A9840	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU	70	25-Sep-23	12-Jan-24	25-Sep-23, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in																													
A9850	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC)	35	15-Jan-24	01-Mar-24	15-Jan-24, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC)																													
<b>PROIECTARE</b>					22-Sep-23, PROIECTARE																													
A9860	Studiu de pre-fezabilitate	10	09-Jan-23	20-Jan-23	09-Jan-23, Studiu de pre-fezabilitate																													
A9880	Studiu de fezabilitate	25	29-May-23	30-Jun-23	29-May-23, Studiu de fezabilitate																													
A9870	Realizarea DTAC	20	03-Jul-23	28-Jul-23	03-Jul-23, Realizarea DTAC																													
A9890	Activitati de proiectare	60	03-Jul-23	22-Sep-23	03-Jul-23, Activitati de proiectare																													
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					27-Nov-23, PROCURARE / ACHIZITII																													
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					29-May-23, SERVICII DE PROIECTARE																													
A9900	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	45	23-Jan-23	24-Mar-23	23-Jan-23, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare																													
A9910	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	27-Mar-23		27-Mar-23, Publicarea licitatatiei pe SEAP, 27-Mar-23																													
A9920	Inscrierea firmelor	15	27-Mar-23	14-Apr-23	27-Mar-23, Inscrierea firmelor																													
A9930	Analiza ofertelor	30	17-Apr-23	26-May-23	17-Apr-23, Analiza ofertelor																													
A9940	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	29-May-23		29-May-23, Desemnarea castigatorului licitatiei, 29-May-23																													
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					27-Nov-23, SERVICII DE EXECUTIE																													
A9950	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare	45	24-Jul-23	22-Sep-23	24-Jul-23, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare																													
A9960	Publicarea licitatatiei pe SEAP	0	25-Sep-23		25-Sep-23, Publicarea licitatatiei pe SEAP, 25-Sep-23																													
A9970	Inscrierea firmelor	15	25-Sep-23	13-Oct-23	25-Sep-23, Inscrierea firmelor																													
A9980	Analiza ofertelor	30	16-Oct-23	24-Nov-23	16-Oct-23, Analiza ofertelor																													
A9990	Desemnarea castigatorului licitatiei	0	27-Nov-23		27-Nov-23, Desemnarea castigatorului licitatiei, 27-Nov-23																													
<b>EXECUTIE</b>					16-Dec-24, EXECUTIE																													
<b>TERENURI SPORTIVE</b>					16-Dec-24, TERENURI SPORTIVE																													
A10240	Predarea amplasamentului de catre Primarie	0	04-Mar-24		04-Mar-24, Predarea amplasamentului de catre Primarie, 04-Mar-24																													
A10250	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor	0	04-Mar-24		04-Mar-24, Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor, 04-Mar-24																													
A10260	Stabilirea Organizarii de santier	5	04-Mar-24	08-Mar-24	04-Mar-24, Stabilirea Organizarii de santier																													
A10270	Activitati de defrisare, pregatire a terenului	10	11-Mar-24	22-Mar-24	11-Mar-24, Activitati de defrisare, pregatire a terenului																													
A10280	Trasare si pichetarea terenului	1	25-Mar-24	25-Mar-24	25-Mar-24, Trasare si pichetarea terenului																													
A10290	Sapatura mecanizata si manuala	10	26-Mar-24	08-Apr-24	26-Mar-24, Sapatura mecanizata si manuala																													
A10300	Activitati de imbunatatire a terenului	20	09-Apr-24	06-May-24	09-Apr-24, Activitati de imbunatatire a terenului																													
A10310	Activitati de executie a terenurilor	90	07-May-24	09-Sep-24	07-May-24, Activitati de executie a terenurilor																													
A10320	Executia iluminatului pentru terenuri si imprejmuirea acestora	70	10-Sep-24	16-Dec-24	10-Sep-24, Executia iluminatului pentru terenuri																													
<b>ZONA DE VESTIARE / DUSURI</b>					08-Nov-24, ZONA DE VESTIARE / DUSURI																													
<b>INFRASTRUCTURA &amp; SUPRASTRUCTURA</b>					20-Sep-24, INFRASTRUCTURA & SUPRASTRUCTURA																													
A10350	Sapatura mecanizata si manuala	7	26-Mar-24	03-Apr-24	26-Mar-24, Sapatura mecanizata si manuala																													
A10360	Turnarea betonului de egalizare	1	04-Apr-24	04-Apr-24	04-Apr-24, Turnarea betonului de egalizare																													
A10370	Cofrarea si armarea fundatiei	5	12-Apr-24	18-Apr-24	12-Apr-24, Cofrarea si armarea fundatiei																													
A10380	Turnarea betonului pentru fundatie + timp de asteptare	30	19-Apr-24	30-May-24	19-Apr-24, Turnarea betonului pentru fundatie + timp de as																													
A10450	Armarea si turnarea stalpilor de sustinere	38	31-May-24	23-Jul-24	31-May-24, Armarea si turnarea stalpilor de sustinere																													
A10460	Armarea si turnarea placii peste parter	35	24-Jul-24	10-Sep-24	24-Jul-24, Armarea si turnarea placii peste parter																													


█ Actual Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 █ Actual Work   
 █ Critical Remaining Work   
 ◆ Milestone   
 ▾ Summary

Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
A10470	Izolarea terasei si montarea straturilor inverse	8	11-Sep-24	20-Sep-24																														
<b>ARHITECTURA</b>																																		
A10400	Compartimentari, inchideri si finisaje	45	09-Sep-24	08-Nov-24																														
<b>INSTALATII</b>																																		
A10410	Realizarea instalatiilor electrice, sanitare, HVAC	35	16-Sep-24	01-Nov-24																														
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>																																		
A10210	Deschidere oficiala si darea in folosinta a obiectivului de inve:	0	16-Dec-24	16-Dec-24																														
<b>SANATATE SI SIGURANTA CETATENI</b>																																		
<b>INFIINTARE DEPARTAMENT POMPIERI VOLUNTARI</b>																																		
A11420	Achizitionare autospeciala stingere incendii	60	01-Oct-21*	23-Dec-21																														
A11430	Amenajarea locatiei detasamentului de voluntari	50	15-Oct-21	23-Dec-21																														
<b>PUNCT PRIM AJUTOR</b>																																		
A11440	Identificarea unei locatii adecvate	60	01-Oct-21*	23-Dec-21																														
A11450	Utilarea conform normelor in vigoare, inclusiv o autospeciala	60	01-Oct-21	23-Dec-21																														
<b>SIGURANTA CETATEANULUI</b>																																		
A11460	Infiintarea unui departament de "Village Security Managemen	45	01-Sep-21*	02-Nov-21																														
A11470	Implementarea unui proiect de supraveghere pe raza comu	990	03-Nov-21	30-Sep-25																														
<b>TIMP LIBER</b>																																		
<b>Zona de promenada COCIOVALISTEA</b>																																		
A11010	PROIECT "ZONA DE PROMENADA"	540	27-Nov-23	26-Jan-26																														
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>																																		
<b>AUTORIZARE</b>																																		
A10480	Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Proiect zona	0	05-Aug-24																															
A10490	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	30	05-Aug-24	13-Sep-24																														
A10500	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU -	60	02-Sep-24	22-Nov-24																														
A10510	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Proiect zona de p	45	30-Sep-24	29-Nov-24																														
<b>PROIECTARE</b>																																		
A10520	Studiu de pre-fezabilitate - Proiect zona de promenada	20	27-Nov-23	22-Dec-23																														
A10540	Studiu de fezabilitate - Proiect zona de promenada	40	13-May-24	05-Jul-24																														
A10530	Realizarea DTAC - Proiect zona de promenada	20	08-Jul-24	02-Aug-24																														
A10550	Activitati de proiectare - Proiect zona de promenada	120	08-Jul-24	20-Dec-24																														
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>																																		
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>																																		
A10560	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect zon	45	08-Jan-24	08-Mar-24																														
A10570	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect zona de promenada	0	11-Mar-24																															
A10580	Inscrierea firmelor - Proiect zona de promenada	15	11-Mar-24	29-Mar-24																														
A10590	Analiza ofertelor - Proiect zona de promenada	30	01-Apr-24	10-May-24																														
A9110	Desemnarea castigatorului licitatatiei - Proiect zona de promen	0	13-May-24																															
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>																																		
A9120	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect zon	45	05-Aug-24	04-Oct-24																														
A9130	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect zona de promenada	0	07-Oct-24																															
A9140	Inscrierea firmelor - Proiect zona de promenada	15	07-Oct-24	25-Oct-24																														
A9150	Analiza ofertelor - Proiect zona de promenada	30	28-Oct-24	06-Dec-24																														
A9160	Desemnarea castigatorului licitatatiei - Proiect zona de promen	0	09-Dec-24																															
<b>ACHIZITII DE MOBILIER STRADAL, ARBORI SI PLANTE</b>																																		
A10640	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect par	45	07-Oct-24	06-Dec-24																														
A9290	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect parcuri	0	09-Dec-24																															
A10650	Inscrierea firmelor - Proiect parcuri	15	09-Dec-24	09-Jan-25																														
A9310	Analiza ofertelor - Proiect parcuri	30	10-Jan-25	20-Feb-25																														
A9320	Desemnarea castigatorului licitatatiei - Proiect parcuri	0	21-Feb-25																															
<b>EXECUTIE</b>																																		

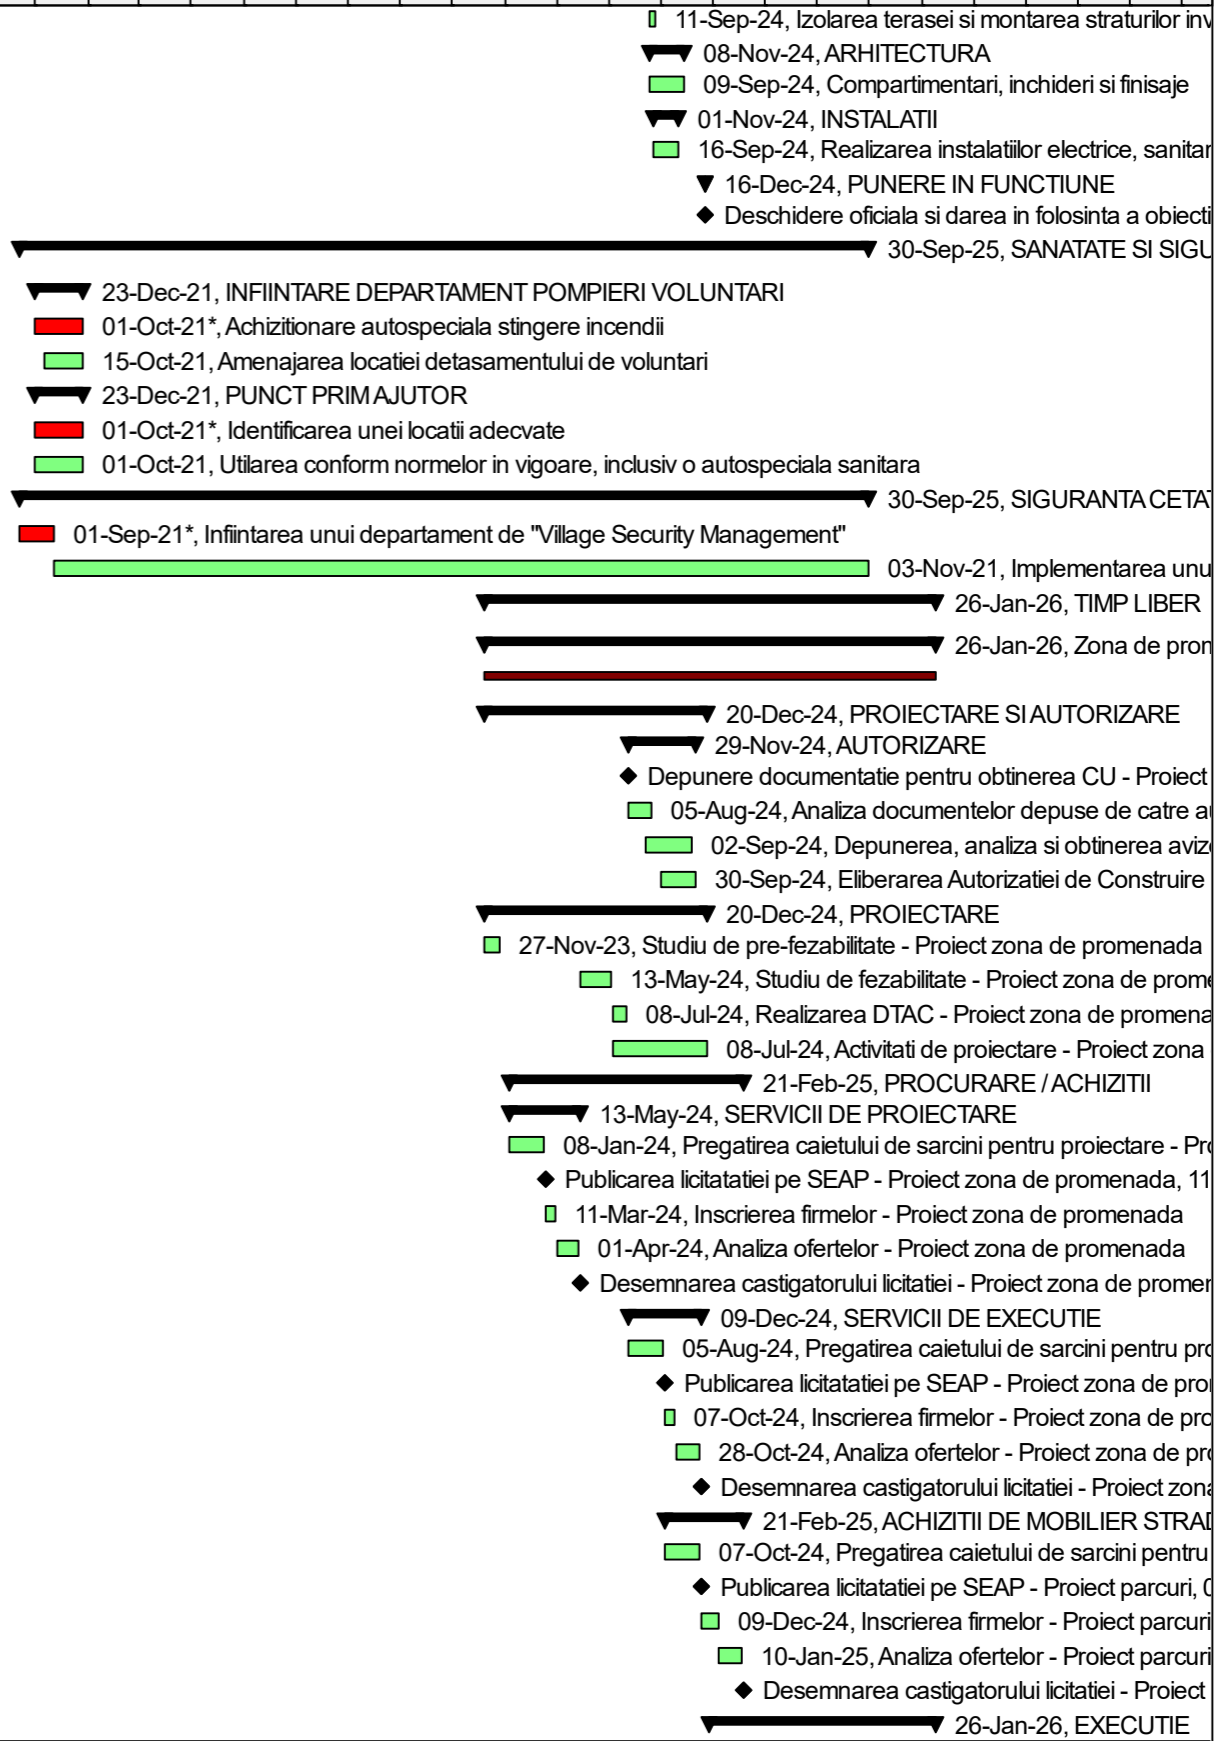

█ Actual Level of Effort    
 █ Remaining Work    
 ◆ Milestone  
█ Actual Work    
 █ Critical Remaining Work    
 ▬ Summary

Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																												
					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A9180	Predarea amplasamentului de catre Primarie - Proiect piata	0	23-Dec-24		◆ Predarea amplasamentului de catre Primarie - I																												
A9190	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Proiec	0	06-Jan-25		◆ Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Const																												
A9230	Stabilirea Organizarii de santier - Proiect piata agroalimentar:	10	23-Dec-24	16-Jan-25	■ 23-Dec-24, Stabilirea Organizarii de santier - F																												
A9200	Activitati de defrisare, pregatire a terenului - Proiect piata agr	25	17-Jan-25	20-Feb-25	■ 17-Jan-25, Activitati de defrisare, pregatire a																												
A10630	Lucrari de arhitectura peisagistica pe langa rau	70	07-Feb-25	15-May-25	■ 07-Feb-25, Lucrari de arhitectura peisa																												
A9220	Realizarea spatiilor de socializare si jocuri de societate	80	28-Feb-25	19-Jun-25	■ 28-Feb-25, Realizarea spatiilor de so																												
A9210	Executia spatiilor de sport in aer liber	40	20-Jun-25	14-Aug-25	■ 20-Jun-25, Executia spatiilor de sp																												
A10610	Executia aleilor	50	15-Aug-25	23-Oct-25	■ 15-Aug-25, Executia aleilor																												
A10600	Montarea mobilierului specific	35	24-Oct-25	11-Dec-25	■ 24-Oct-25, Montarea mobili																												
A10620	Plantarea arborilor si plantelor ornamentale	60	24-Oct-25	26-Jan-26	■ 24-Oct-25, Plantarea arb ▼ 26-Jan-26, PUNERE IN I ◆ Finalizarea obiectivului de																												
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>		<b>0</b>	<b>26-Jan-26</b>	<b>26-Jan-26</b>																													
A9170	Finalizarea obiectivului de investitii	0		26-Jan-26																													
<b>MOBILITATE</b>		<b>1477</b>	<b>03-May-21</b>	<b>18-Feb-27</b>																													
<b>LINE TRANSPORT LOCAL CARTIER MECHEAUJA</b>		<b>22</b>	<b>03-May-21</b>	<b>01-Jun-21</b>																													
A11170	Analize si demersuri pentru introducerea in circuit a liniei de t	21	03-May-21*	31-May-21																													
A11180	Darea in folosinta a liniei de transport catre cartier Mecheauz	0		01-Jun-21																													
<b>REALIZAREA SI FINALIZARE DRUMURI ALTERNATIVE CATRE DN1</b>		<b>1006</b>	<b>08-Oct-21</b>	<b>26-Sep-25</b>																													
A10900	PROIECT "REALIZARE SI FINALIZARE DRUMURI ALTERN	971	26-Nov-21	26-Sep-25																													
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>		<b>426</b>	<b>08-Oct-21</b>	<b>12-Jun-23</b>																													
<b>AUTORIZARE</b>		<b>165</b>	<b>18-Oct-22</b>	<b>12-Jun-23</b>																													
A8330	Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Realizarea d	0	18-Oct-22		◆ Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Realizarea de drumuri alternative, 18-Oct-22																												
A8340	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	60	18-Oct-22	16-Jan-23	■ 18-Oct-22, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea CU - Realizare																												
A8350	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU -	60	17-Jan-23	10-Apr-23	■ 17-Jan-23, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU - Realizarea																												
A8360	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Realizarea de dr	45	11-Apr-23	12-Jun-23	■ 11-Apr-23, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Realizarea de drumuri a																												
<b>PROIECTARE</b>		<b>356</b>	<b>08-Oct-21</b>	<b>06-Mar-23</b>																													
A8370	Studiu de pre-fezabilitate - Realizarea de drumuri alternative	35	08-Oct-21	25-Nov-21	■ 08-Oct-21, Studiu de pre-fezabilitate - Realizarea de drumuri alternative																												
A8390	Studiu de fezabilitate - Realizarea de drumuri alternative	90	26-Apr-22	29-Aug-22	■ 26-Apr-22, Studiu de fezabilitate - Realizarea de drumuri alternative																												
A8380	Realizarea DTAC - Realizarea de drumuri alternative	35	30-Aug-22	17-Oct-22	■ 30-Aug-22, Realizarea DTAC - Realizarea de drumuri alternative																												
A8400	Activitati de proiectare - Realizarea de drumuri alternative	130	30-Aug-22	06-Mar-23	■ 30-Aug-22, Activitati de proiectare - Realizarea de drumuri alternative																												
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>		<b>312</b>	<b>26-Nov-21</b>	<b>22-Feb-23</b>																													
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>		<b>101</b>	<b>26-Nov-21</b>	<b>26-Apr-22</b>																													
A8410	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Realizarea	60	26-Nov-21	25-Feb-22	■ 26-Nov-21, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Realizarea de drumuri alternative																												
A8420	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Realizarea de drumuri altern:	0	28-Feb-22		◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP - Realizarea de drumuri alternative, 28-Feb-22																												
A8430	Inscrierea firmelor - Realizarea de drumuri alternative	21	28-Feb-22	28-Mar-22	■ 28-Feb-22, Inscrierea firmelor - Realizarea de drumuri alternative																												
A8440	Analiza ofertelor - Realizarea de drumuri alternative	20	29-Mar-22	25-Apr-22	■ 29-Mar-22, Analiza ofertelor - Realizarea de drumuri alternative																												
A8450	Desemnarea castigatorului licitatatiei - Realizarea de drumuri a	0	26-Apr-22		◆ Desemnarea castigatorului licitatatiei - Realizarea de drumuri alternative, 26-Apr-22																												
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>		<b>101</b>	<b>27-Sep-22</b>	<b>22-Feb-23</b>																													
A8460	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Realizarea	60	27-Sep-22	19-Dec-22	■ 27-Sep-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Realizarea de drumuri alter																												
A8470	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Realizarea de drumuri altern:	0	20-Dec-22		◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP - Realizarea de drumuri alternative, 20-Dec-22																												
A8480	Inscrierea firmelor - Realizarea de drumuri alternative	21	20-Dec-22	24-Jan-23	■ 20-Dec-22, Inscrierea firmelor - Realizarea de drumuri alternative																												
A8490	Analiza ofertelor - Realizarea de drumuri alternative	20	25-Jan-23	21-Feb-23	■ 25-Jan-23, Analiza ofertelor - Realizarea de drumuri alternative																												
A8500	Desemnarea castigatorului licitatatiei - Realizarea de drumuri a	0	22-Feb-23		◆ Desemnarea castigatorului licitatatiei - Realizarea de drumuri alternative, 22-Feb-23																												
<b>EXECUTIE</b>		<b>580</b>	<b>13-Jun-23</b>	<b>26-Sep-25</b>																													
<b>PARTE CAROSABILA</b>		<b>580</b>	<b>13-Jun-23</b>	<b>26-Sep-25</b>																													
A1670	Predarea amplasamentului de catre Primarie - Realizarea de	0	13-Jun-23		◆ Predarea amplasamentului de catre Primarie - Realizarea de drumuri alternativ																												
A1680	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Realiz	0	14-Jun-23		◆ Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Realizarea de drumuri a																												
A1690	Stabilirea Organizarii de santier - Realizarea de drumuri alter	10	13-Jun-23	26-Jun-23	■ 13-Jun-23, Stabilirea Organizarii de santier - Realizarea de drumuri alternative																												
A1700	Decaparea strazii in intregime - Realizarea de drumuri altern:	120	27-Jun-23	11-Dec-23	■ 27-Jun-23, Decaparea strazii in intregime - Realizarea de drumuri alt																												
A1710	Sapatura la -0,2 m; 0,35 m - Realizarea de drumuri alternati	200	25-Jul-23	13-May-24	■ 25-Jul-23, Sapatura la -0,2 m; 0,35 m - Realizarea de drum																												
A1730	Asternerea stratului de pietris - Realizarea de drumuri altern:	80	16-Apr-24	05-Aug-24	■ 16-Apr-24, Asternerea stratului de pietris - Realizarea d																												
A1720	Compactarea patului de drum - Realizarea de drumuri altern	100	02-Apr-24	19-Aug-24	■ 02-Apr-24, Compactarea patului de drum - Realizarea																												

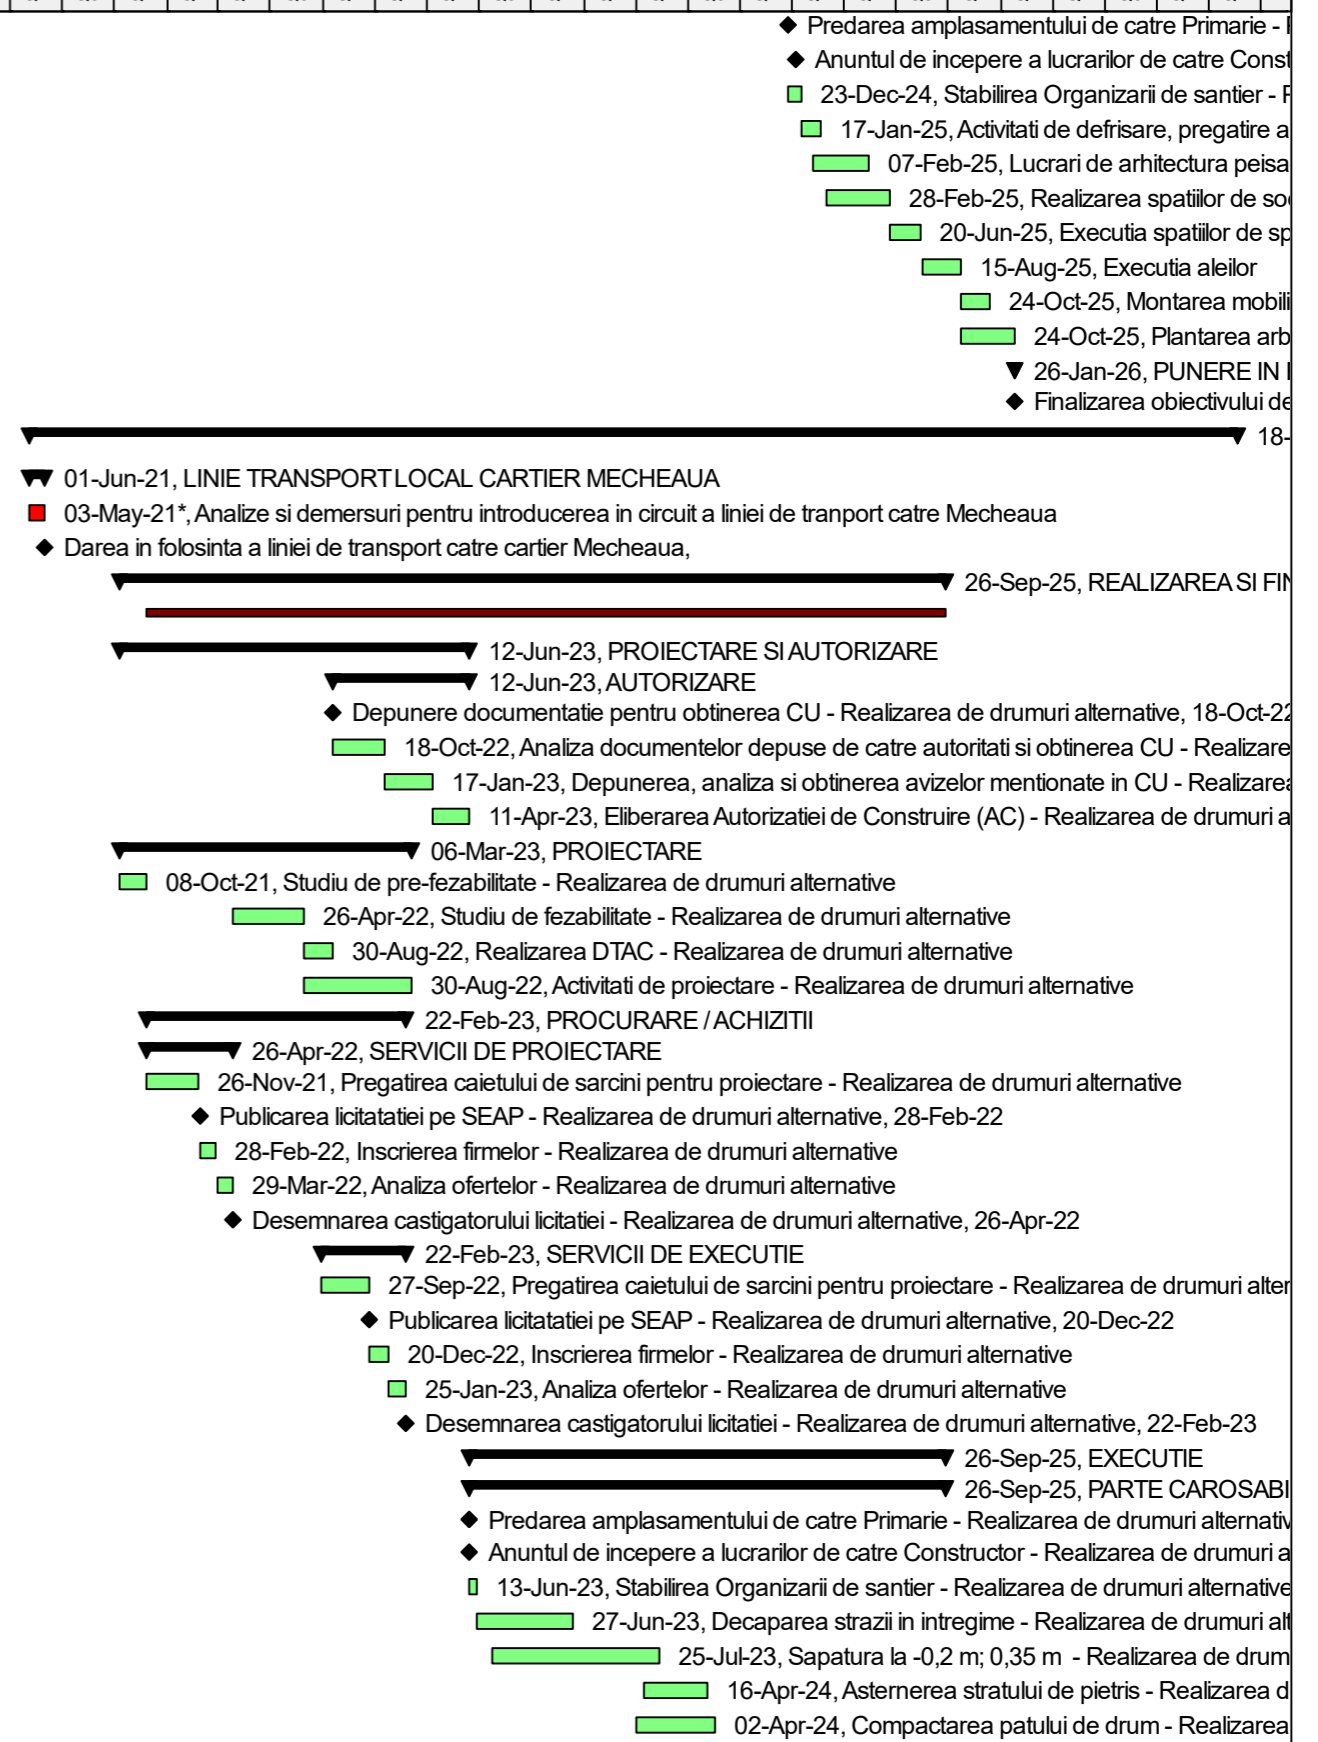


█ Actual Work     █ Remaining Work     ◆ Milestone  
█ Critical Remaining Work     ▬ Summary






Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																													
					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>					▼ 27-Feb-23, PUNERE IN FUNCTIUNE																													
A8260	Finalizarea obiectivului de investitie - Sensuri giratorii	0	27-Feb-23	27-Feb-23	◆ Finalizarea obiectivului de investitie - Sensuri giratorii,																													
<b>MODERNIZAREA TROTUARELOR SI TRECEREA RETELOR SUBTERAN</b>					▶ 23-Sep-26,																													
A10920	PROIECT "MODERNIZAREA TROTUARELOR"	1181	01-Feb-22	23-Sep-26																														
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					▶ 18-Jul-23, PROIECTARE SI AUTORIZARE																													
<b>AUTORIZARE</b>					▶ 18-Jul-23, AUTORIZARE																													
A8770	Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Modernizare	0	12-Oct-22		◆ Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Modernizarea trotuarelor, 12-Oct-22																													
A8780	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	50	12-Oct-22	20-Dec-22	■ 12-Oct-22, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea CU - Moderniza																													
A8790	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU -	100	21-Dec-22	16-May-23	■ 21-Dec-22, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU - Modern																													
A8800	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Modernizarea tro	45	17-May-23	18-Jul-23	■ 17-May-23, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Modernizarea trotuar																													
<b>PROIECTARE</b>					▶ 21-Feb-23, PROIECTARE																													
A8810	Studiu de pre-fezabilitate - Modernizarea trotuarelor	25	01-Feb-22	07-Mar-22	■ 01-Feb-22, Studiu de pre-fezabilitate - Modernizarea trotuarelor																													
A8830	Studiu de fezabilitate - Modernizarea trotuarelor	60	22-Jun-22	13-Sep-22	■ 22-Jun-22, Studiu de fezabilitate - Modernizarea trotuarelor																													
A8820	Realizarea DTAC - Modernizarea trotuarelor	20	14-Sep-22	11-Oct-22	■ 14-Sep-22, Realizarea DTAC - Modernizarea trotuarelor																													
A8840	Activitati de proiectare - Modernizarea trotuarelor	110	14-Sep-22	21-Feb-23	■ 14-Sep-22, Activitati de proiectare - Modernizarea trotuarelor																													
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					▶ 02-Feb-23, PROCURARE / ACHIZITII																													
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					▶ 22-Jun-22, SERVICII DE PROIECTARE																													
A8850	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizar	35	08-Mar-22	25-Apr-22	■ 08-Mar-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizarea trotuarelor																													
A8860	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea trotuarelor	0	26-Apr-22		◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea trotuarelor, 26-Apr-22																													
A8870	Inscrierea firmelor - Modernizarea trotuarelor	21	26-Apr-22	24-May-22	■ 26-Apr-22, Inscrierea firmelor - Modernizarea trotuarelor																													
A8880	Analiza ofertelor - Modernizarea trotuarelor	20	25-May-22	21-Jun-22	■ 25-May-22, Analiza ofertelor - Modernizarea trotuarelor																													
A8890	Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea trotuarelo	0	22-Jun-22		◆ Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea trotuarelor, 22-Jun-22																													
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					▶ 02-Feb-23, SERVICII DE EXECUTIE																													
A8900	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizar	35	12-Oct-22	29-Nov-22	■ 12-Oct-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizarea trotuarelor																													
A8910	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea trotuarelor	0	30-Nov-22		◆ Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea trotuarelor, 30-Nov-22																													
A8920	Inscrierea firmelor - Modernizarea trotuarelor	21	30-Nov-22	04-Jan-23	■ 30-Nov-22, Inscrierea firmelor - Modernizarea trotuarelor																													
A8930	Analiza ofertelor - Modernizarea trotuarelor	20	05-Jan-23	01-Feb-23	■ 05-Jan-23, Analiza ofertelor - Modernizarea trotuarelor																													
A8940	Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea trotuarelo	0	02-Feb-23		◆ Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea trotuarelor, 02-Feb-23																													
<b>EXECUTIE</b>					▶ 23-Sep-26,																													
A9050	Predarea amplasamentului de catre Primarie - Modernizarea	0	19-Jul-23		◆ Predarea amplasamentului de catre Primarie - Modernizarea trotuarelor, 19-																													
A9060	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Mode	0	20-Jul-23		◆ Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Modernizarea trotuare																													
A9070	Stabilirea Organizarii de santier - Modernizarea trotuarelor	10	19-Jul-23	01-Aug-23	■ 19-Jul-23, Stabilirea Organizarii de santier - Modernizarea trotuarelor																													
A9020	Decaparea stratului de uzura si sapatura - Modernizarea tro	180	02-Aug-23	23-Apr-24	■ 02-Aug-23, Decaparea stratului de uzura si sapatura - Mode																													
A9030	Reconfigurarea dimensiunilor trotuarelor - Modernizarea trot	150	24-Apr-24	19-Nov-24	■ 24-Apr-24, Reconfigurarea dimensiunilor trotuare																													
A9040	Astermere strat de pietris - Modernizarea trotuarelor	120	20-Nov-24	19-May-25	■ 20-Nov-24, Astermere strat de pietris - M																													
A8980	Compactarea stratului de pietris - Modernizarea trotuarelor	80	20-May-25	08-Sep-25	■ 20-May-25, Compactarea stratul																													
A9090	Astermerea suplimentara a stratului stabilizator - Modernizare	70	09-Sep-25	15-Dec-25	■ 09-Sep-25, Astermerea sup																													
A9080	Compactarea stratului stabilizator suplimentar - Modernizare	80	16-Sep-25	14-Jan-26	■ 16-Sep-25, Compactarea																													
A8970	Montarea bordurilor - Modernizarea trotuarelor	80	15-Jan-26	06-May-26	■ 15-Jan-26, Montare																													
A9000	Montarea marcajelor verticale (semne de circulatie) - Moderr	45	07-May-26	08-Jul-26	■ 07-May-26, Mo																													
A8990	Astermerea stratului de uzura pietonal - Modernizarea trotuar	100	07-May-26	23-Sep-26	■ 07-May-26,																													
A9010	Finalizare proiect parte pietonala - Modernizarea trotuarelor	0		23-Sep-26	◆ Finalizare p																													
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>					▶ 23-Sep-26,																													
A8950	Finalizarea obiectivului de investitie - Modernizarea trotuarelc	0		23-Sep-26	◆ Finalizarea																													
<b>MODERNIZAREA STATIILOR DE AUTOBUZ</b>					▶ 05-Aug-25, MODERNIZAREA STA																													
A10930	PROIECT "MODERNIZAREA STATIILOR DE AUTOBUZ"	872	01-Mar-22	05-Aug-25																														
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					▶ 17-Oct-23, PROIECTARE SI AUTORIZARE																													
<b>AUTORIZARE</b>					▶ 17-Oct-23, AUTORIZARE																													
A7720	Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Modernizare	0	12-Apr-23		◆ Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Modernizarea statiilor de autobuz,																													
A7730	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	30	12-Apr-23	23-May-23	■ 12-Apr-23, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea CU - M																													
A7740	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU -	60	24-May-23	15-Aug-23	■ 24-May-23, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU - M																													
A7750	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Modernizarea sta	45	16-Aug-23	17-Oct-23	■ 16-Aug-23, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Modernizarea sta																													

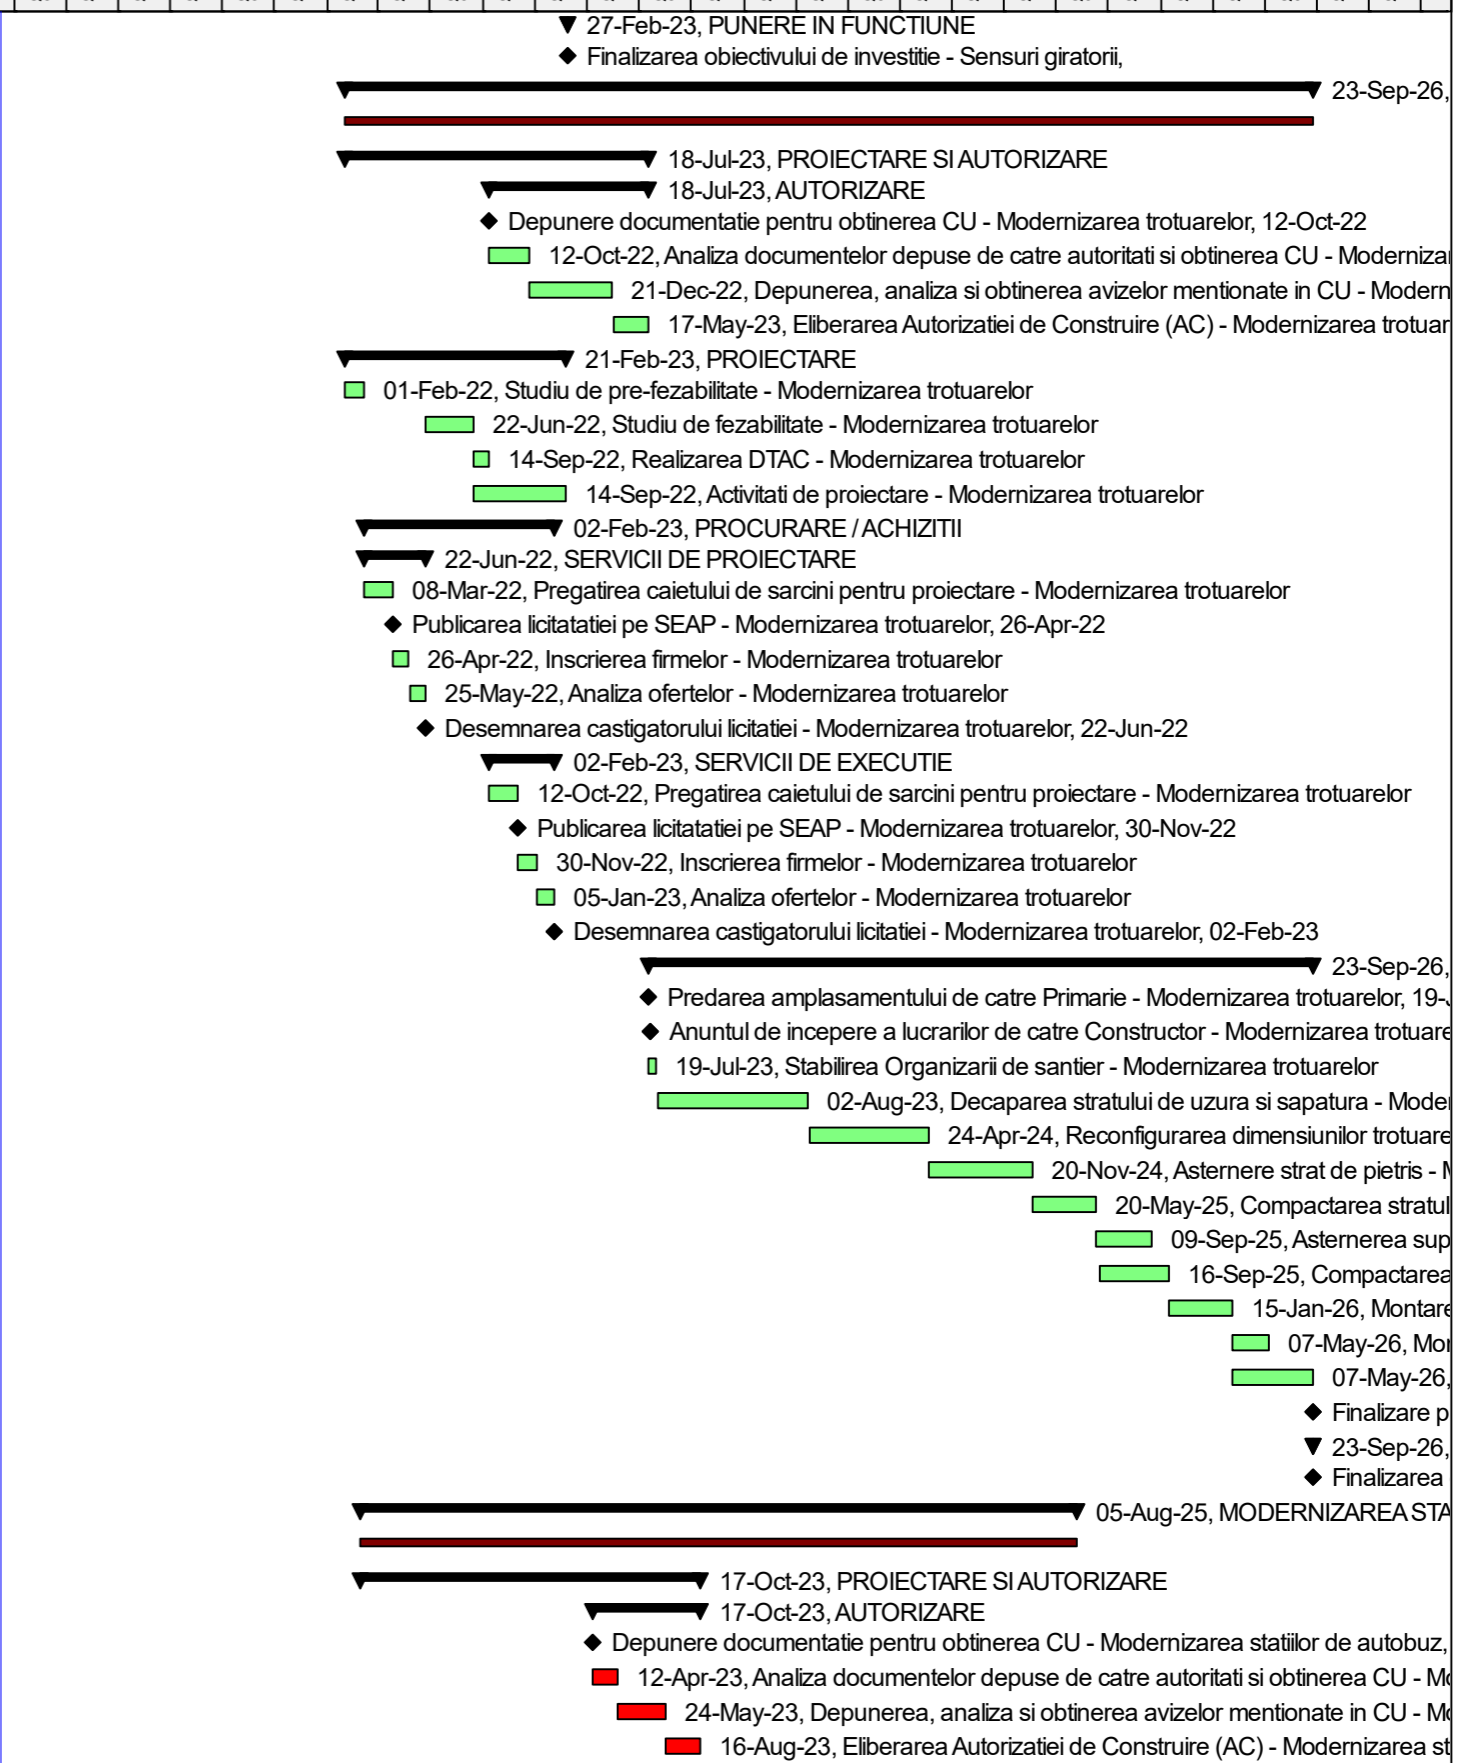

■ Actual Level of Effort   
 ■ Remaining Work   
 ■ Actual Work   
 ■ Critical Remaining Work   
 ◆ Milestone   
 ▶ Summary

Cod Activitate	Denumire Activitate	Durata Estimata	Data de Start	Data de Finalizare	2020-2027																													
					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2					
<b>PROIECTARE</b>					15-Aug-23, PROIECTARE																													
A7760	Studiu de pre-fezabilitate - Modernizarea statiilor de autobuz	45	01-Mar-22*	02-May-22	01-Mar-22*, Studiu de pre-fezabilitate - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7770	Studiu de fezabilitate - Modernizarea statiilor de autobuz	80	21-Sep-22	17-Jan-23	21-Sep-22, Studiu de fezabilitate - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7780	Realizarea DTAC - Modernizarea statiilor de autobuz	60	18-Jan-23	11-Apr-23	18-Jan-23, Realizarea DTAC - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7790	Activitati de proiectare - Modernizarea statiilor de autobuz	150	18-Jan-23	15-Aug-23	18-Jan-23, Activitati de proiectare - Modernizarea statiilor de autobuz																													
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					06-Jul-23, PROCURARE / ACHIZITII																													
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					21-Sep-22, SERVICII DE PROIECTARE																													
A7800	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizar	50	03-May-22	11-Jul-22	03-May-22, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7810	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea statiilor de aut	0	12-Jul-22		Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea statiilor de autobuz, 12-Jul-22																													
A7820	Inscrierea firmelor - Modernizarea statiilor de autobuz	21	12-Jul-22	09-Aug-22	12-Jul-22, Inscrierea firmelor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7830	Analiza ofertelor - Modernizarea statiilor de autobuz	30	10-Aug-22	20-Sep-22	10-Aug-22, Analiza ofertelor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7840	Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea statiilor de	0	21-Sep-22		Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea statiilor de autobuz, 21-Sep-22																													
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					06-Jul-23, SERVICII DE EXECUTIE																													
A7850	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizar	50	15-Feb-23	25-Apr-23	15-Feb-23, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7860	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea statiilor de aut	0	26-Apr-23		Publicarea licitatatiei pe SEAP - Modernizarea statiilor de autobuz, 26-Apr-23																													
A7870	Inscrierea firmelor - Modernizarea statiilor de autobuz	21	26-Apr-23	24-May-23	26-Apr-23, Inscrierea firmelor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7880	Analiza ofertelor - Modernizarea statiilor de autobuz	30	25-May-23	05-Jul-23	25-May-23, Analiza ofertelor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7890	Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea statiilor de	0	06-Jul-23		Desemnarea castigatorului licitatiei - Modernizarea statiilor de autobuz, 06-Jul-23																													
<b>EXECUTIE</b>					05-Aug-25, EXECUTIE																													
A7900	Predarea amplasamentului de catre Primarie - Modernizarea	0	18-Oct-23		Predarea amplasamentului de catre Primarie - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7910	Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Mode	0	19-Oct-23		Anuntul de incepere a lucrarilor de catre Constructor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7920	Stabilirea Organizarii de santier - Modernizarea statiilor de al	60	18-Oct-23	23-Jan-24	18-Oct-23, Stabilirea Organizarii de santier - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7930	Executia lucrarilor de montaj a statiilor si asamblarea compor	370	25-Jan-24	08-Jul-25	25-Jan-24, Executia lucrarilor de montaj a statiilor de autobuz																													
A7940	Instalarea sistemului digital pentru bilete si trasee - Modernizz	350	07-Mar-24	22-Jul-25	07-Mar-24, Instalarea sistemului digital pentru bilete si trasee - Modernizarea statiilor de autobuz																													
A7950	Efectuarea testelor - Modernizarea statiilor de autobuz	350	21-Mar-24	05-Aug-25	21-Mar-24, Efectuarea testelor - Modernizarea statiilor de autobuz																													
<b>PUNERE IN FUNCTIUNE</b>					05-Aug-25, PUNERE IN FUNCTIUNE																													
A8040	Finalizarea obiectivului de investitie - Modernizarea statiilor d	0	05-Aug-25	05-Aug-25	05-Aug-25, Finalizarea obiectivului de investitie - Modernizarea statiilor de autobuz																													
<b>PISTE DE BICILETE</b>					17-Sep-26, PISTE DE BICILETE																													
A11520	Proiect "Piste de biciclete"	321	17-Jun-25	17-Sep-26	17-Jun-25, Proiect "Piste de biciclete"																													
<b>PROIECTARE SI AUTORIZARE</b>					13-May-26, PROIECTARE SI AUTORIZARE																													
<b>AUTORIZARE</b>					13-May-26, AUTORIZARE																													
A11190	Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Proiect piste	0	22-Jan-26		22-Jan-26, Depunere documentatie pentru obtinerea CU - Proiect piste pentru biciclete																													
A11200	Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea	15	22-Jan-26	11-Feb-26	22-Jan-26, Analiza documentelor depuse de catre autoritati si obtinerea avizelor mentionate in CU - Proiect piste pentru biciclete																													
A11220	Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Proiect piste pent	30	19-Mar-26	29-Apr-26	19-Mar-26, Eliberarea Autorizatiei de Construire (AC) - Proiect piste pentru biciclete																													
A11210	Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU -	60	19-Feb-26	13-May-26	19-Feb-26, Depunerea, analiza si obtinerea avizelor mentionate in CU - Proiect piste pentru biciclete																													
<b>PROIECTARE</b>					29-Apr-26, PROIECTARE																													
A11230	Studiu de pre-fezabilitate - Proiect piste pentru biciclete	15	17-Jun-25	07-Jul-25	17-Jun-25, Studiu de pre-fezabilitate - Proiect piste pentru biciclete																													
A11250	Studiu de fezabilitate - Proiect piste pentru biciclete	25	11-Nov-25	15-Dec-25	11-Nov-25, Studiu de fezabilitate - Proiect piste pentru biciclete																													
A11240	Realizarea DTAC - Proiect piste pentru biciclete	20	16-Dec-25	21-Jan-26	16-Dec-25, Realizarea DTAC - Proiect piste pentru biciclete																													
A11260	Activitati de proiectare - Proiect piste pentru biciclete	90	16-Dec-25	29-Apr-26	16-Dec-25, Activitati de proiectare - Proiect piste pentru biciclete																													
<b>PROCURARE / ACHIZITII</b>					28-May-26, PROCURARE / ACHIZITII																													
<b>SERVICII DE PROIECTARE</b>					11-Nov-25, SERVICII DE PROIECTARE																													
A11270	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect pist	45	08-Jul-25	08-Sep-25	08-Jul-25, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect piste pentru biciclete																													
A11280	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect piste pentru biciclete	0	09-Sep-25		Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect piste pentru biciclete																													
A11290	Inscrierea firmelor - Proiect piste pentru biciclete	15	09-Sep-25	29-Sep-25	09-Sep-25, Inscrierea firmelor - Proiect piste pentru biciclete																													
A11300	Analiza ofertelor - Proiect piste pentru biciclete	30	30-Sep-25	10-Nov-25	30-Sep-25, Analiza ofertelor - Proiect piste pentru biciclete																													
A11310	Desemnarea castigatorului licitatiei - Proiect piste pentru bic	0	11-Nov-25		Desemnarea castigatorului licitatiei - Proiect piste pentru biciclete																													
<b>SERVICII DE EXECUTIE</b>					28-May-26, SERVICII DE EXECUTIE																													
A11320	Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect pist	45	22-Jan-26	25-Mar-26	22-Jan-26, Pregatirea caietului de sarcini pentru proiectare - Proiect piste pentru biciclete																													
A11330	Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect piste pentru biciclete	0	26-Mar-26		Publicarea licitatatiei pe SEAP - Proiect piste pentru biciclete																													
A11340	Inscrierea firmelor - Proiect piste pentru biciclete	15	26-Mar-26	15-Apr-26	26-Mar-26, Inscrierea firmelor - Proiect piste pentru biciclete																													
A11350	Analiza ofertelor - Proiect piste pentru biciclete	30	16-Apr-26	27-May-26	16-Apr-26, Analiza ofertelor - Proiect piste pentru biciclete																													

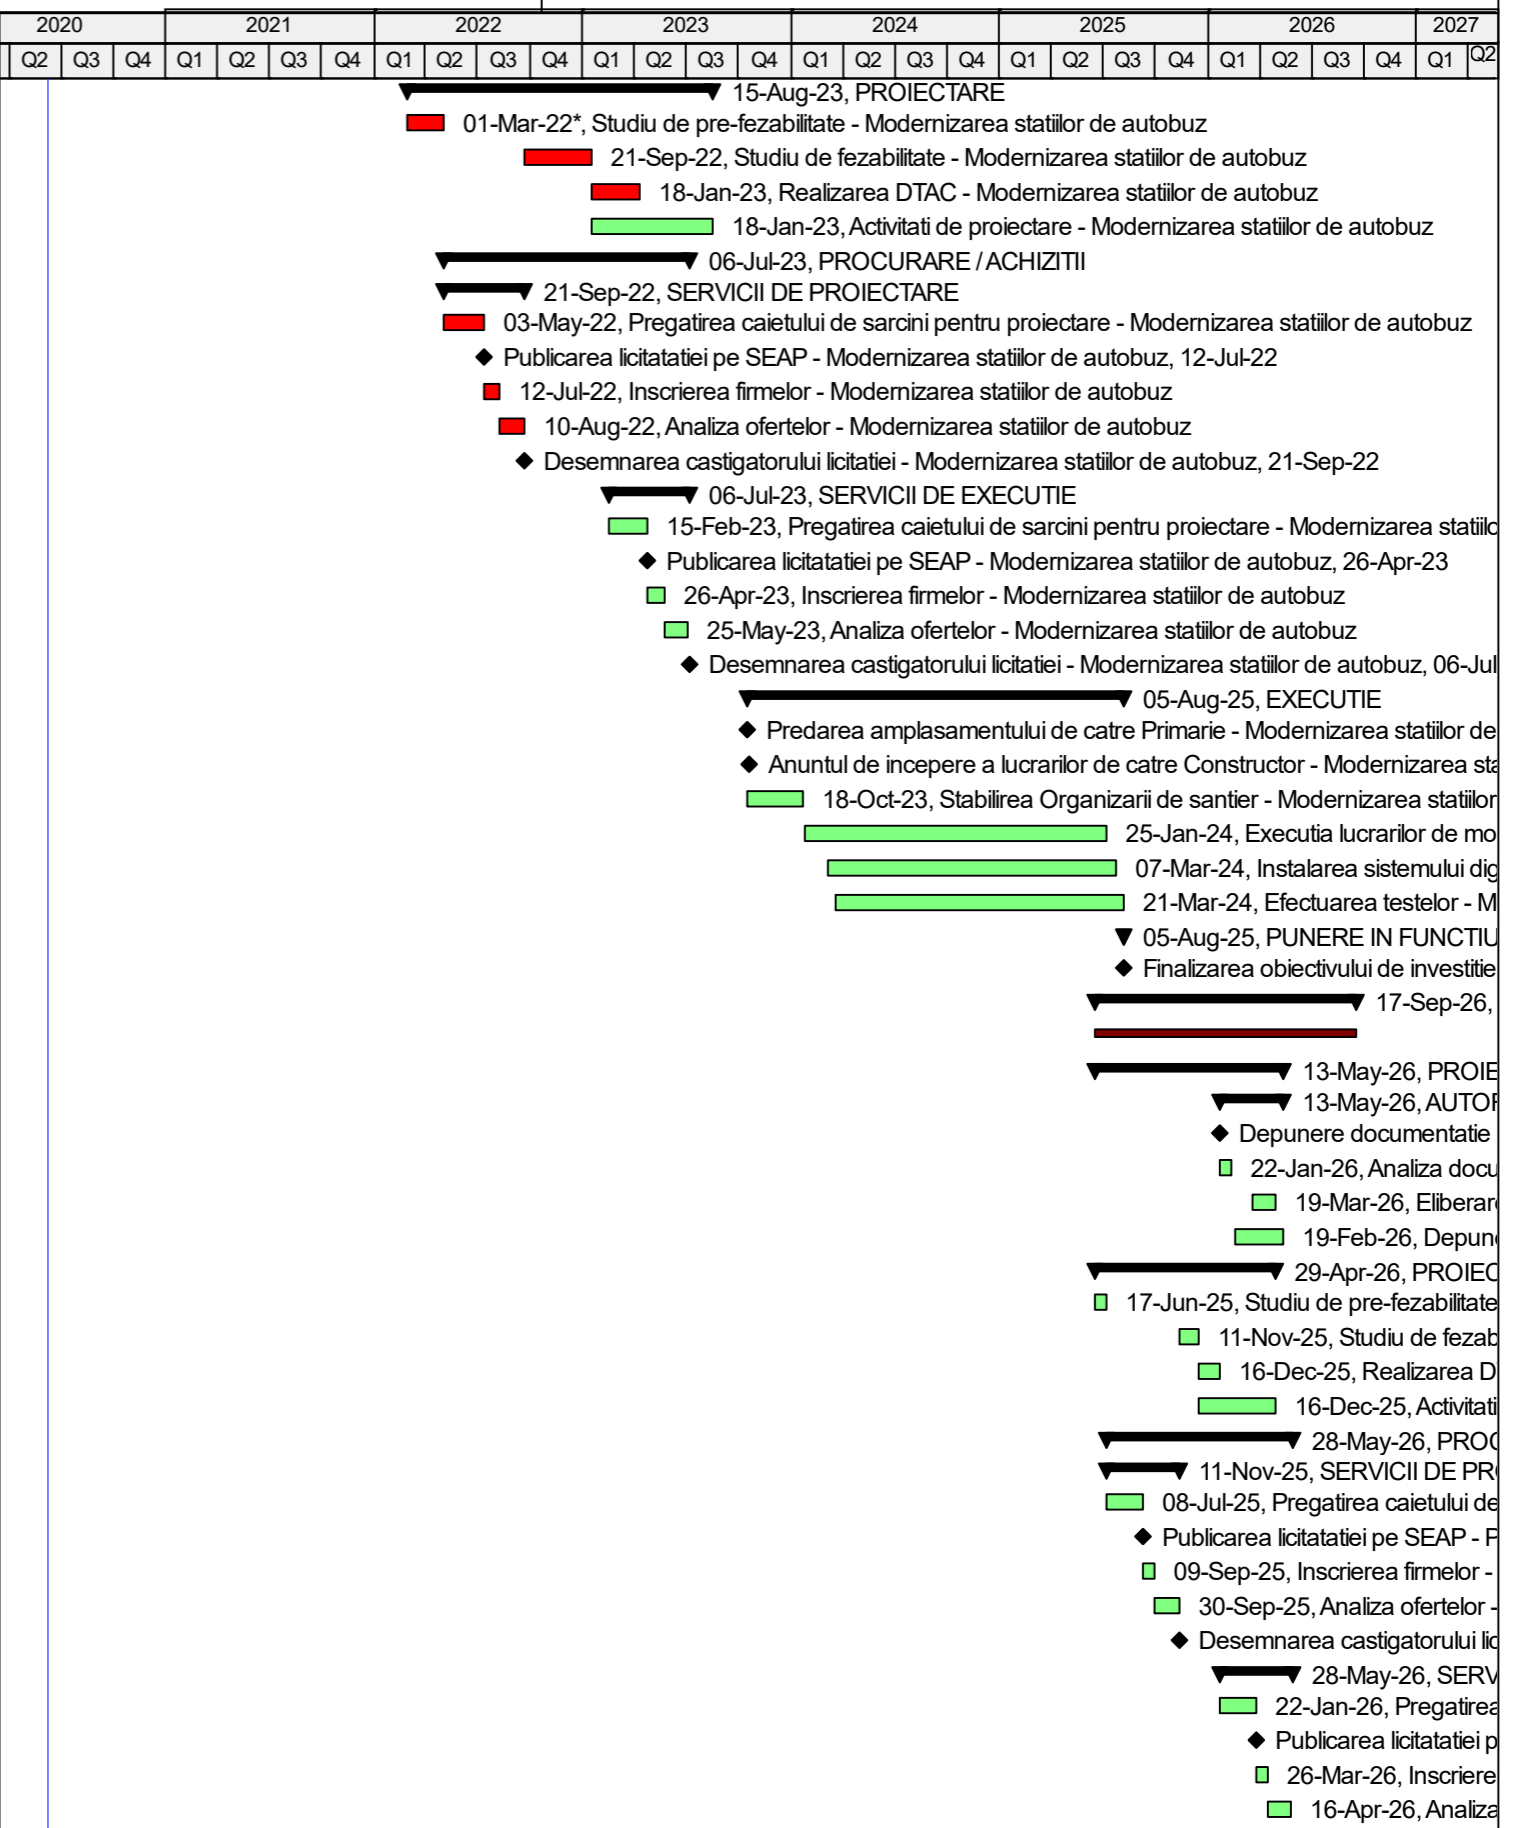

█ Actual Level of Effort   
 █ Remaining Work   
 █ Actual Work   
 █ Critical Remaining Work   
 ◆ Milestone   
 ⇨ Summary

